# Gestión de Proyectos de Ingeniería del Software



Lluis Martinez Botella (Jefe proyecto) DNI:74396630W

Francisco Baeza Terol DNI:48668989T

Juan Ramón García Richarte DNI:74388253C

Enrique Laura Bernabeu DNI:45931245S

Santiago Molto Martinez DNI:46084101J

# Testing:

Utilizar varios textos de ejemplo de distintas páginas web para ver su funcionalidad. Como prueba también hemos cogido a personas ajenas para que comprobaran su funcionamiento.

Finalmente, no hubo integración debido a que no dio tiempo a finalizar el proyecto

# Guía para la instalación en estación Linux:

#### Fase 1: Instalación del servidor APACHE2

Usar los siguientes comandos para instalar APACHE2 para HTML y PHP:

- >> sudo apt-get update
- >> sudo apt-get install apache2
- >> sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y

Fase 2: Colocación de los archivos

Colocar en el directorio /var/www/html/ los archivos:

- -Index.html
- -whoarewe.html
- -contact.html

Y la carpeta: umhiiti2gpis\_files

### Fase 3: Redirección de puertos

El servidor está atendiendo el puerto 80 del router, por tanto, hay que configurarlo para que redirija las peticiones del puerto 80 a la dirección IP del servidor.

Esto se hace de distintas formas según el router concreto, pero por lo general sigue los siguientes pasos:

1º Entrar a la página del router. Pedirá usuario y contraseña (mírese en las instrucciones del router o contacte con su proveedor)

2º Acceder a la sección de redirección/reenvío de puertos (Port Forwarding).

3º Añadir una nueva entrada con la siguiente información:

-Nombre del servicio: HTTP

-Protocolo: TCP/UDP


-Puerto de inicio y destino externo: 80

-Puerto de inicio y destino interno: 80


-Dirección IP interna: Dirección IP del servidor.

## Documentos de conclusiones finales:

## -Diagrama de Gantt con tiempos reales

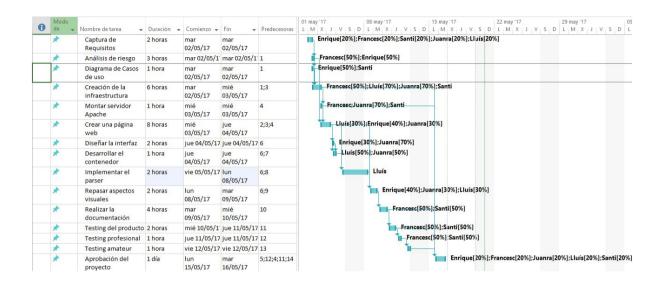

# -Explicación entre valor hora real y el obtenido con COCOMMO

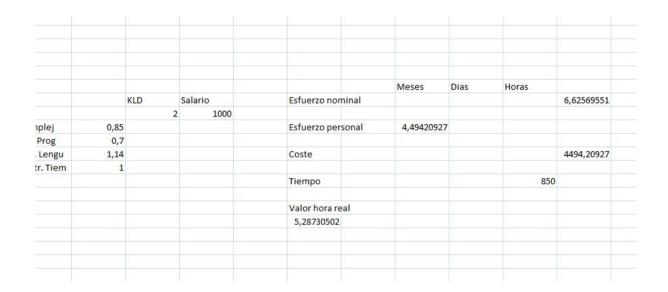

Estimación obtenida con COCOMMO

			-0.100.000	-o-dominant		Meses	Dias	Horas	
		KLD	Salario	Esfuerzo non	nınal				6,62569551
		2	1000						
Complej	0,85			Esfuerzo per	sonal	4,94363019			
Cal. Prog	0,7								
Exp. Lengu	1,14			Coste					4943,63019
Restr. Tiem	1,1								
				Tiempo		0,25	7,5	60	
				Valor hora real					
				82,3938365					

#### Valores reales

Como podemos apreciar, el valor hora ha aumentado considerablemente respecto a las estimaciones iniciales. Esto se debe a que en un principio estas se hicieron con grandes cantidades de tiempo en mente, de las que al final no hemos disponido.

### -Desviaciones respecto al análisis y diseño original

Debido a problemas tanto internos como externos, el proyecto ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su creación. Estas, junto a los problemas que han surgido, se tratarán más a fondo en la sección de *evaluación de riesgos*.

## Evaluación de riesgos:

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. A continuación, haremos una evaluación sobre los riesgos surgidos durante el desarrollo de este proyecto. Estos han sido los problemas surgidos:

- Disminución de calidad.
- Falta de tiempo para desarrollar correctamente el proyecto.
- Fallo en algunos equipos informáticos.
- Enfermedades sufridas por algunos miembros del equipo informático.
- Cambios repentinos de horarios.
- Problemas de código en la implementación del parser.


Todos estos problemas han provocado que el proyecto final no sea como en un principio se pensó, la falta de tiempo y las enfermedades sufridas por algunos miembros del grupo han sido los principales problemas que se ha encontrado este grupo para poder desarrollar correctamente el proyecto. Esto ha provocado que el producto final haya habido una disminución de calidad. Por motivos de trabajo, algunos miembros del grupo han sufrido cambios de horarios y por tanto más dificultad para reunirnos y hacer las evaluaciones correspondientes de cómo iba el trabajo. A todo esto, hay que sumarle que un miembro del grupo sufrió un fallo en su equipo informático que provocó que todo se retrasara un poco y no fuera como se había planteado. Y por último, al ser un proyecto informático, hemos sufrido problemas en la implementación, pero esto era algo que ya teníamos previsto y se puede considerar el problema más esperado.

Si comparamos los requisitos iniciales con el resultado final la verdad es que se ha conseguido lo propuesto. La web tiene una interfaz intuitiva y amigable para que la pueda utilizar cualquier usuario, el servidor apache proporciona bastante estabilidad y funciona correctamente. La página dispone de un cuadro de texto además de una opción para subir archivos para el input del servidor. Y para ver el resultado, ofrecemos un cuadro de texto para visualizar el resultado final y además la bajada del archivo ya convertido al formato deseado

Cabe decir que el resultado final se asemeja mucho al proyecto que se diseñó al principio. Por tanto, el resultado resulta satisfactorio para el equipo debido a que, a pesar de los problemas, el producto final realiza lo que se pedía y se exigía, es decir, cumple con los requisitos iniciales. Pero la página web es algo básica y un poco rudimentaria y nos hubiera gustado disponer de más tiempo para mejorarla y convertirla en algo más sofisticado.



Interfaz originalmente planteada



Interfaz implementada finalmente

#### Revisión final de las últimas versiones:

